

**ПУТІВНИК ПЛАНУ ДЛЯ UKRAINE FACILITY
(огляд за II та III квартали 2025 року)***

Анотація. Путівник містить огляд стану реалізації Плану для Ukraine Facility, кількості виконаних заходів (зобов'язань), а також запланованих до виконання у II та III кварталах 2025 року, дані про отримані транші тощо. Наведено інформацію щодо прогресу та потенційних ризиків невиконання/невчасного виконання заходів, передбачених Планом для Ukraine Facility.

Ключові слова: зовнішнє фінансування, гранти, кредити, Ukraine Facility, заходи (зобов'язання), євроінтеграція.

ЗМІСТ

I. Вступна частина.....	4
<i>Резюме щодо результатів моніторингу виконання заходів (зобов'язань) Плану для Ukraine Facility за II та III квартали 2025 року.....</i>	<i>5</i>
II. Заходи (зобов'язання), які мають бути виконані у II кварталі 2025 року.....	10
III. Заходи (зобов'язання), які мають бути виконані у III кварталі 2025 року.....	21

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Цей Путівник підготовлено на основі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року про започаткування Ukraine Facility (далі – Регламент (ЄС) 2024/792)¹, Плану для Ukraine Facility на 2024–2027 роки², а також інформації з бази «Законодавство України» та даних моніторингу прогресу реалізації Плану для Ukraine Facility Міністерством економіки України³.

29 лютого 2024 року було прийнято Регламент (ЄС) 2024/792⁴. Загальними цілями інструменту Ukraine Facility є підтримка України:

- у подоланні соціальних, економічних та екологічних наслідків збройної агресії проти України, тим самим сприяючи мирному відновленню, відбудові та модернізації країни в повоєнний період, зокрема шляхом створення соціально-економічних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають під тимчасовим захистом;

- у сприянні соціальній та територіальній згуртованості, демократичній, економічній, екологічній стійкості, прогресивній інтеграції в ЄС і в глобальну економіку та ринки, а також економічному, соціальному та екологічному наближенню України до стандартів Союзу;

- у впровадженні політичних, інституційних, правових, адміністративних, соціальних та економічних реформ, необхідних для узгодження з цінностями Союзу та поступової адаптації до правил, стандартів, політик і практик Союзу з огляду на майбутнє членство в Союзі, тим самим сприяючи стабільності, безпеці, миру, процвітання та стійкості.

Допомога в межах нового інструменту підтримки України надається щоквартально у формі пільгових кредитів (33 млрд євро) та грантів (5,27 млрд євро) за результатами виконання заходів (зобов'язань), визначених у Плані для Ukraine Facility, який є основою для реалізації інструменту та затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244-р, схвалений Європейською Комісією у квітні 2024 року та затверджений Радою ЄС у травні 2024 року. План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ у державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання. Його реалізація сприятиме європейській інтеграції України та подальшому стійкому розвитку економіки нашої держави.

Документ містить понад 150 заходів (зобов'язань) за 69 напрямками на період до 2027 року. У разі відсутності прогресу у їх виконанні перерахування коштів у межах інструменту буде тимчасово призупинено, але Україна може

¹ Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine Facility. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng>

² План для Ukraine Facility на 2024–2027 роки. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf>

³ Прогрес реалізації Плану України: головна панель даних моніторингу. URL: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWYyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNmNmIwNDA5LWQ5OWQ5NDQ2Mi05YTY3LTViZmQyY2I0YTE0NjY5J9>

⁴ Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine Facility. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng>

розраховувати на виплати протягом 12 місяців за умови впровадження відповідних реформ.

Резюме щодо результатів моніторингу виконання заходів (зобов'язань) Плану для Ukraine Facility за II та III квартали 2025 року.

У II кварталі 2025 року Україна була зобов'язана виконати 11 заходів (зобов'язань). Із них станом на 01 липня 2025 року:

- 6 заходів (зобов'язань) можуть бути оцінені як виконані, а саме:


- 1) затвердження стратегії врегулювання непрацюючих кредитів;
- 2) прийняття стратегії малого і середнього підприємництва та плану заходів щодо її реалізації;
- 3) схвалення та опублікування на вебпорталі Міністерства розвитку громад та територій України дослідження щодо необхідних заходів для надання територіальним громадам статусу юридичної особи;
- 4) впровадження дорожньої карти процесу відокремлення надбавки за відновлювальну енергію від тарифу на передачу;
- 5) запуск міжнародних тендерів угод про розподіл продукції (далі – УРП) із забезпеченням їх прозорості;
- 6) відновлення обов'язкової системи моніторингу, звітності та верифікації (далі – МЗВ).

- 5 заходів (зобов'язань) можуть бути оцінені як невиконані, а саме:

- 1) набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їх перевірки;
- 2) набрання чинності Законом України «Про професійну освіту»;
- 3) набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про закупівлю соціальних послуг коштом державного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів;
- 4) опублікування портфоліо інвестиційних проєктів у видобувній галузі щодо критичних сировинних ресурсів;
- 5) набрання чинності законом щодо цифровізації виконавчого провадження.



Отже, за результатами аналізу встановлено, що українською стороною виконано 66 % від загальної кількості заходів (зобов'язань) Плану для Ukraine Facility, запланованих до виконання у II кварталі 2025 року.

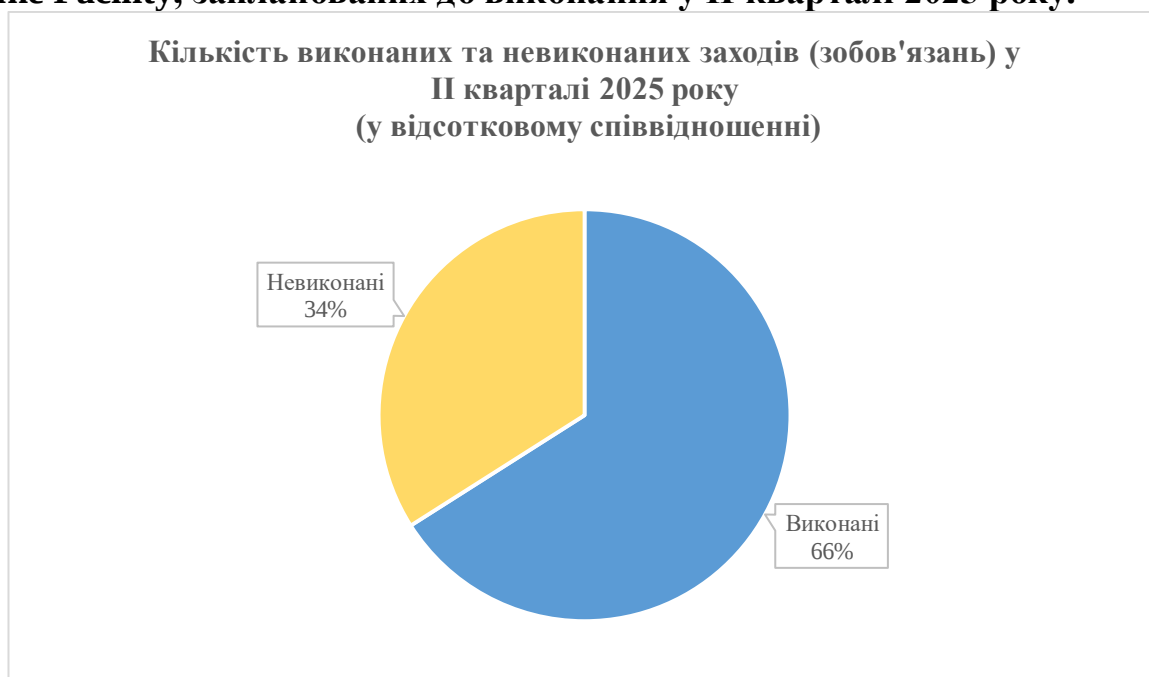

У III кварталі 2025 року до виконання передбачено 12 заходів (зобов'язань), із них станом на 01 липня 2025 року:

- 10 заходів (зобов'язань) можуть бути оцінені як заходи з невисоким ступенем ризику невиконання:

- 1) набрання чинності законодавством про державну підтримку сільського господарства України;
- 2) прийняття плану заходів із дерегуляції (етап 2);
- 3) прийняття гармонізованих стандартів для трьох груп промислової продукції;

4) підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання;

5) затвердження 2-го національного внеску України до Паризької угоди;

6) набрання чинності змінами до законодавства щодо удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби;

7) оцінка та, в разі необхідності, внесення змін та набрання чинності законодавством щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних обов'язків та діяльності, не пов'язаної з виконанням спеціальних обов'язків;

8) скасування призупинення дії Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» та відновлення контролю над наданням державної допомоги, а також гармонізація законодавства з *acquis* ЄС;

9) реалізація дорожньої карти реформування системи управління публічними інвестиціями;

10) опублікування звіту за підсумками верифікації запасів стратегічних корисних копалин в Україні;

- **2 заходи (зобов'язання) можуть бути оцінені як такі, що мають високий ступінь ризику невиконання**, а саме:

1) заповнення не менше 20 % вакансій суддів;

2) створення нового суду для розгляду адміністративних справ.



Отже, станом на 01 липня 2025 року українською стороною **повноцінно не виконано 100 % заходів (зобов'язань), передбачених до виконання у III кварталі 2025 року, із них 6 заходів (зобов'язань) виконано частково, а саме:**

- прийняття плану заходів із дерегуляції (етап 2);
- прийняття гармонізованих стандартів для трьох груп промислової продукції;
- заповнення не менше 20 % вакансій суддів;

- створення нового суду для розгляду адміністративних справ;
- реалізація дорожньої карти реформування системи управління публічними інвестиціями;
- опублікування звіту за підсумками верифікації запасів стратегічних корисних копалин в Україні.



Водночас важлива роль у цьому процесі належить Верховній Раді України, оскільки:

- у ІІ кварталі 2025 року виконання 4 заходів (зобов'язань) з 11 – це прийняття відповідних законодавчих актів (36,36 % від загальної кількості);
- у ІІІ кварталі 2025 року виконання 6 заходів (зобов'язань) з 12 – це прийняття відповідних законодавчих актів (50 % від загальної кількості).

За результатами моніторингу реалізації Плану для Ukraine Facility встановлено, що для виконання заходів (зобов'язань) за ІІ квартал 2025 року прийнято 3 із необхідних 4 законодавчих актів, а за ІІІ квартал із необхідних 6 законодавчих актів – не прийнято жодного.



Також варто зауважити, що Європейська Комісія перевірятиме не лише виконання передбачених заходів (зобов'язань), але і відсутність змін у вже проведених реформах, що відповідно посилює роль Верховної Ради України та її комітетів у реалізації Плану для Ukraine Facility.

Згідно з частиною другою статті 26 Регламенту (ЄС) 2024/792 Міністерство економіки України як національний координатор направляє Європейській Комісії належним чином обґрунтований запит на виплату чергового траншу фінансової підтримки. Водночас такий запит має супроводжуватися низкою документів, що демонструють виконання відповідних заходів (зобов'язань) Плану для Ukraine Facility та на основі яких Європейська Комісія підготує свою оцінку стосовно стану виконання Україною зазначених заходів (зобов'язань), за результатами якої Рада ЄС прийме рішення про надання/ненадання чергового траншу фінансової підтримки в межах інструменту Ukraine Facility.

Отже, за результатами моніторингу виконання заходів (зобов'язань) Плану для Ukraine Facility можна зробити такі висновки:

1) результати моніторингу виконання заходів (зобов'язань) II кварталу 2025 року свідчать, що окремі нормативно-правові акти потребують уваги щодо узгодження введення їх в дію з часовими рамками Плану для Ukraine Facility;

2) результати моніторингу виконання заходів (зобов'язань) III кварталу 2025 року дають підстави стверджувати, що наразі ступінь ризику невчасного виконання/невиконання заходів (зобов'язань) може оцінюватися як невисокий. Проте задля мінімізації зростання ступеня ризику невчасного виконання/невиконання окремі заходи (зобов'язання), наприклад ті, які вимагають розроблення, прийняття та набрання чинності законодавчими актами, потребуватимуть інтенсифікації роботи усіх заінтересованих органів.

У Путівнику наведено результати моніторингу виконання кожного заходу (зобов'язання) Плану для Ukraine Facility за II та III квартали 2025 року з розширеним аналізом індикаторів.

II. ЗАХОДИ (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У II КВАРТАЛІ 2025 РОКУ

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ПЕРЕГЛЯД ДЕКЛАРАЦІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ ПЕРЕВІРКИ

(Розділ 3. Судова система)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Набирають чинності закон та акти Вищої кваліфікаційної комісії суддів (далі – ВККС), відповідно до яких мають бути переглянуті декларації доброчесності суддів та процедура їх перевірки.

Ці правові акти повинні бути зосереджені на:

- уточненні змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки;
- розширенні часового періоду, на який поширюється перевірка;
- удосконаленні процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначенні прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз'ясненні правових наслідків перевірки.

Відповідальні виконавці: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою).

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ Зареєстровані законопроекти у Верховній Раді України:
- «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів» (реєстр. № 13165 від 09.04.2025);
 - «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів» (реєстр. № 13165-1 від 23.04.2025);
 - «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв'язків судді» (реєстр. № 13165-2 від 25.04.2025) – прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч. 1 ст. 116 Регламенту Верховної Ради України та зі

**МАЄ БУТИ
ВИКОНАНО:****РИЗИКИ
НЕВИКОНАННЯ/
НЕВЧАСНОГО
ВИКОНАННЯ**

скороченням строку підготовки до другого читання (03.06.2025).

- ❖ Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законів щодо зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів» і набрання ним чинності.
- ❖ Внесення змін до рішень ВККС щодо декларацій доброчесності кандидата на посаду судді та судді.
- ❖ Станом на 01 липня 2025 року закони не прийнято. Зважаючи на зазначене, ступінь ризику невиконання/невчасного виконання заходу (зобов'язання) може бути оцінений як високий.

2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ НЕПРАЦЮЮЧИХ КРЕДИТІВ

(Розділ 5. Фінансові ринки)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Стратегія врегулювання непрацюючих кредитів, розроблена відповідно до чинного законодавства ЄС, затверджена.

Стратегія направлена на такі основні сфери:

- посилення пруденційних вимог до визнання та врегулювання проблемних кредитів;
- обмін даними про проблемні кредити та іншими відповідними ринковими даними між фінансовими установами та державними органами для покращення вирішення проблемних кредитів;
- огляд потенційних перешкод і розроблення заходів для покращення основи для реструктуризації та врегулювання проблемних кредитів.

Відповідальні виконавці: Національний банк України (за згодою), Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Фонд державного майна України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ Рада з фінансової стабільності на засіданні 06 червня 2024 року схвалила Стратегію з розвитку кредитування (далі – Стратегія), однією зі стратегічних цілей якої є підвищення якості кредитного портфеля, що передбачатиме реалізацію комплексу заходів із метою скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) у портфелях банків.

- ✓ Стратегія зосереджена, зокрема, на:
- зменшенні рівня NPL шляхом посилення та відновлення вимог до оцінки кредитного ризику та оприлюднення даних банками;
 - розширенні доступу банків та інших учасників фінансового ринку до інформації з державних електронних інформаційних ресурсів (державні реєстри);
 - удосконаленні законодавчого регулювання фінансової реструктуризації та списання.

3. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ»

(Розділ 7. Людський капітал)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Закон України «Про професійну освіту» прийнятий та набрав чинності:

- визначено справедливі правила функціонування суб'єктів освітньої діяльності на ринку освітніх послуг у сфері професійної освіти;
- розширено інституційні спроможності суб'єктів освітньої діяльності у наданні формальної та неформальної професійної освіти;
- врегульовано відносини закладів професійної освіти, національних/локальних та міжнародних стейкхолдерів для сталого розвитку людського капіталу в Україні.

Відповідальні виконавці: Міністерство освіти і науки України та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ 16 квітня 2025 року проект Закону України «Про професійну освіту» (№ 13107-д від 11 квітня 2025 р.) **прийнято за основу** з доопрацюванням. Наразі законопроект готується до другого читання.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

- ❖ Прийняття Закону України, положення якого повністю відповідають індикатору.

- ❖ Набранням Законом України чинності.

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

- ❖ Зважаючи, що Верховною Радою України законопроект № 13107-д прийнято в першому читанні, станом на 01 липня 2025 року ступінь ризику невиконання/невчасного виконання

заходу (зобов'язання) може оцінюватися як високий.

4. НАБИРАЄ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРО ЗАКУПІВЛЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КОШТОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Розділ 7. Людський капітал)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів України щодо закупівлі соціальних послуг коштом Державного бюджету прийнята.

Постанова є фінансово нейтральною і жодним чином не впливає на боргову стійкість України та зосереджується на таких основних напрямках:

- перехід від фінансування установ до моделі закупівлі соціальних послуг, орієнтованої на результат;
- запровадження механізму закупівлі окремих соціальних послуг у зареєстрованих державних та приватних надавачів соціальних послуг на основі встановлених стандартів соціальних послуг та критеріїв для надавачів.

Відповідальні виконавці: Міністерство соціальної політики України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 764 «Про реалізацію експериментального проекту із закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю».
- ✓ Станом на 01 липня 2025 року відсутня інформація про стан підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо закупівлі соціальних послуг коштом державного бюджету.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

- ❖ Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо закупівлі соціальних послуг коштом державного бюджету.
- ❖ Важливо, щоб постанова була фінансово нейтральною й не впливала на боргову стійкість України, а також зосереджувалася на таких напрямках:

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

- перехід від фінансування установ до моделі закупівлі соціальних послуг, орієнтованої на результат;
- запровадження механізму закупівлі окремих соціальних послуг у зареєстрованих державних та приватних надавачів соціальних послуг на основі встановлених стандартів соціальних послуг та критеріїв для надавачів.

❖ Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України.

❖ Станом на 01 липня 2025 року постанову не прийнято. Варто зазначити щодо прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 764 можна розглядати лише як часткове виконання. Зважаючи на зазначене, ступінь ризику невиконання/невчасного виконання заходу (зобов'язання) може бути оцінений як високий.

5. ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (Розділ 8. Бізнес-середовище)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії малого і середнього підприємництва (далі – МСП) та Плану заходів з її реалізації прийнята та набирає чинності.

Стратегія фокусується на таких основних напрямках:

- доступ до ринків;
- доступ до фінансів та інших ресурсів;
- доступ до знань.

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України та інші центральні органи виконавчої влади України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024–2027 роках» від 30 серпня 2024 року № 821-р.
- ✓ Стратегією визначено, зокрема, такі оперативні цілі:

- полегшення доступу до капіталу та ресурсів;
- сприяння інноваційній діяльності;
- стимулювання «зеленого переходу»;
- відповідальне та інклюзивне підприємництво;
- посилення конкурентоспроможності та збільшення експорту тощо.

- ✓ В Операційному плані заходів визначено:
- відповідальні за виконання;
 - строки виконання;
 - індикатори виконання;
 - очікувані результати;
 - джерела фінансування.

6. СХВАЛЕННЯ ТА ОПУБЛІКУВАННЯ НА ВЕБПОРТАЛІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ НАДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (Розділ 9. Децентралізація та регіональна політика)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Результати дослідження щодо можливості надання територіальним громадам статусу юридичної особи опубліковані на офіційному вебпорталі Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство юстиції України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ 14 червня 2025 року на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України опубліковано інформацію про презентацію результатів дослідження щодо можливості надання територіальним громадам статусу юридичної особи⁵.

⁵ У Мінрозвитку презентували дослідження щодо надання громадам статусу юридичної особи. Вебсайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: <https://www.decentralization.ua/news/19716?page=1182>

7. ВПРОВАДЖЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ПРОЦЕСУ ВІДОКРЕМЛЕННЯ НАДБАВКИ ЗА ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ ЕНЕРГІЮ ВІД ТАРИФУ НА ПЕРЕДАЧУ (Розділ 10. Енергетичний сектор)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Розроблення та затвердження Дорожньої карти процесу відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на передачу з визначенням необхідних законодавчих актів та термінів впровадження.

Відповідальні виконавці: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (за згодою).

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

✓ Прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 року № 612-р «Про затвердження Дорожньої карти відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії та плану заходів щодо реалізації Дорожньої карти відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2025 і 2026 роки».

8. ОПУБЛІКУВАННЯ ПОРТФОЛІО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У ВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ ЩОДО КРИТИЧНИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ. ПІДГОТОВКА ТА ПРОСУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ДІЛЯНОК НАДР, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ ТА УРП ДЛЯ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Опубліковано портфель інвестиційних проєктів із видобутку критичної сировини.

Відповідальні виконавці: Державна служба геології та надр України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ 15 серпня 2024 року Державна служба геології та надр України (далі – Держгеонадра) опублікувала для обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться в користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами». Проектом пропонується затвердити перелік зі 100 незаліцензованих ділянок. Серед корисних копалин: руди алюмінію, заліза, титану, літію, нікелю, кобальту, міді, марганцю, берилію, золота, танталу, ніобію, олова, апатиту, бариту, графіту, калійної солі, флюориту⁶.
- ✓ У березні 2025 року Держгеонадра опублікувала новий проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення». Додатки до нього включають 2 переліки ділянок надр, що надаватимуться в користування через е-аукціони та ті, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП)⁷.
- ✓ У 2024 році було опубліковано Портфоліо критичної сировини України з переліком інвестиційних можливостей у цій галузі⁸.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

- ❖ Опубліковано портфель інвестиційних проектів із видобутку критичної сировини.

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

- ❖ Станом на 01 липня 2025 року не опубліковано портфель інвестиційних проектів із видобутку критичної сировини. Зважаючи на зазначене,

⁶ Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами». Вебсайт Державної служби геології та надр України. URL: <https://www.geo.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proyektiv-regulyatornyh-aktiv/>

⁷ Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення». Вебсайт Державної служби геології та надр України. URL: <https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2025/03/1884.pdf>

⁸ Портфоліо критичної сировини України. URL: <https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/critical-minerals-portfolio-ua.pdf>

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання заходу (зобов'язання) може бути оцінений як високий.

9. ЗАПУСК МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕРІВ УРП ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЇХ ПРОЗОРОСТІ

(Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Розпочато міжнародні конкурси щодо угод про розподіл продукції (УРП) із використанням типових умов цих угод, затверджених Урядом та оприлюднених. Прозорість конкурсів та угод про розподіл продукції забезпечується через відкритий доступ до умов та зміст угод.

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України, Міністерство енергетики України й Державна служба геології та надр України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку; Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ Розпочато проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції із забезпеченням їх прозорості в межах ділянок нафтогазоносних надр (строк проведення – червень 2025 року).
- ✓ 08 квітня 2025 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:
 - № 391 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Свічанської ділянки»⁹;
 - № 392 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської ділянки»¹⁰.

Протягом 2-х місяців із дня прийняття рішення про проведення конкурсу відповідні оголошення мають бути

⁹ Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Свічанської ділянки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2025 № 391. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedenn-vuhlevodniv-iaki-vydobuvatymutsia-u-mezhakh-svichanskoi-dilianky-i-391>

¹⁰ Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської ділянки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2025 № 392. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedennia-konkursu-na-ukladennia-uhody-pro-rozpodil-vuhlevodniv-iaki-s392080425>

опубліковані на офіційному вебсайті Міністерства енергетики України.

✓ Умови конкурсів опубліковано як додатки до названих вище постанов Кабінету Міністрів України.

10. ВІДНОВЛЕННЯ ОBOB'ЯЗКОВОЇ СИСТЕМИ МЗВ (Розділ 15. Зелений перехід та охорона довкілля)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Відновлюється обов'язкова система моніторингу, звітності та верифікації (далі – МЗВ) для установок, що підпадають під сферу охоплення чинного законодавства, за винятком тих, що не контролюються, зруйновані або знаходяться на тимчасово окупованій території, чи офіційно оголосили призупинення діяльності з точки зору виробництва.

Відповідальні виконавці: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 8 січня 2025 року № 4187-IX (набрав чинності 01 лютого 2025 року).
- ✓ Закон № 4187-IX передбачає:
 - введення обов'язковості подання документів, визначених положеннями Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», для операторів, що не здійснювали подання з моменту введення воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022;
 - розмежування операторів на тих, чия установка не зазнала, зазнала значних (повністю зруйновані) пошкоджень або незначних (частково зруйновані) пошкоджень; деталізацію обов'язку щодо подання документів, визначених положеннями Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», операторами таких установок.

11. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ ЩОДО ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

(Розділ 3. Судова система)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Набрав чинності закон щодо виконання судових рішень щодо майнових та немайнових зобов'язань та подальшої цифровізації виконавчого провадження.

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ **Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження»** (реєстр. № 9363 від 07.06.2023) 20 листопада 2024 року Верховною Радою України прийнято за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 14 травня 2025 року законопроект направлено на повторне друге читання. 02 червня 2025 року надано порівняльну таблицю до повторного другого читання.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

- ❖ Прийняття Закону України щодо виконання судових рішень щодо майнових та немайнових зобов'язань та подальшої цифровізації виконавчого провадження та набрання ним чинності.

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

- ❖ Станом на 01 липня 2025 року закон не прийнято. Зважаючи на зазначене, ступінь ризику невиконання/невчасного виконання заходу (зобов'язання) може бути оцінений як високий.

III. ЗАХОДИ (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У III КВАРТАЛІ 2025 РОКУ

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (Розділ 12. Агропродовольчий сектор)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Закон про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» прийнятий і набув чинності.

Закон зосереджується на таких напрямках:

- розробка майбутніх заходів державної підтримки, зокрема в окремих секторах на основі галузевого та SWOT-аналізу, які відповідають стандартам ЄС та acquis ЄС;
- розробка заходів для підтримки сільськогосподарського виробництва для малих фермерських господарств щодо здійснення приватних інвестицій (фізичні активи сільськогосподарських підприємств, для перероблення та маркетингу);
- розробка майбутніх фінансових інструментів (включно із кредитними гарантіями) для всіх категорій господарств у співпраці з міжнародними фінансовими установами;
- оцифрування через системи електронного документообігу;
- державна підтримка надається виключно бенефіціарам, зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі, із доступом до електронних реєстрів (включно із земельним кадастром, реєстром власності, реєстром тварин).

Відповідальні виконавці: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ 17 червня 2025 року Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі» (реєстр. № 13202-1 від 07.05.2025) прийнято за основу зі скороченим строком підготовки.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

- ✓ Прийняття та набрання чинності Законом України, положення якого передбачають виконання індикатора заходу (зобов'язання).

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

- ❓ Станом на 01 липня 2025 року Закон не прийнято. Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу

2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

2. ПРИЙНЯТТЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ІЗ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ (ЕТАП 2) (Розділ 8. Бізнес-середовище)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Прийнято та набрало чинності законодавство щодо дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу, яке зосереджено на напрямках:

- цифровізації дозвільних і ліцензійних процедур шляхом реалізації експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів;
- скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження добровільного страхування та аудиту;
- врегулювання питання правонаступництва дозвільних документів та ліцензій у разі зміни організаційно-правової форми суб'єкта господарювання.

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України, Державна регуляторна служба України, інші центральні органи виконавчої влади.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ 09 січня 2025 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період», який врегульовує питання **правонаступництва ліцензій та документів дозвільного характеру** у разі зміни організаційно-правової форми суб'єкта господарювання шляхом злиття, приєднання або перетворення;
- ✓ з 18 вересня 2024 року функціонує **Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл)**, у рамках реалізації якої запроваджено такі послуги:
 - подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці;
 - подання заявки та отримання висновку Міністерства економіки України щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі.

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Прийнято наказ Міністерства економіки України від 13 січня 2025 року № 324 «Деякі питання надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, засобами Єдиної державної електронної системи дозвільних документів».

✓ Триває подальша реалізація експериментального проекту щодо запровадження «Дозвіл (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2024 року № 795 «Про реалізацію першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів»).

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

✓ Розроблення та прийняття законодавства щодо скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження добровільного страхування та аудиту.

**РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/
НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ**

❓ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

3. ПРИЙНЯТТЯ ГАРМОНІЗОВАНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ ТРЬОХ ГРУП ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (Розділ 8. Бізнес-середовище)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Європейські стандарти для 3 груп промислових товарів (машини, електромагнітна сумісність обладнання, низьковольтне електрообладнання) прийнято методом перекладу як національні.

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (за згодою).

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ**ВИКОНАНО:**

✓ Наказом Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки) від 08 грудня 2020 року № 2569

затверджено Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з **електромагнітної сумісності обладнання**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077.

✓ Наказом Мінекономіки від 05 січня 2021 року № 74 затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту з **електромагнітної сумісності обладнання**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, сформований на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1326 від 05.08.2019.

✓ Наказом Мінекономіки від 26 березня 2024 року № 7673 затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту **низьковольтного електричного обладнання**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067. До Переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, опублікованим у межах реалізації Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2023/2723 від 06.12.2023 щодо гармонізованих стандартів для електричного обладнання, розроблених на підтримку Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради.

✓ Наказом Мінекономіки від 23 квітня 2024 року № 10302 (на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в «Офіційному віснику Європейського Союзу» L 194/45 від 02.08.2023) затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування **Технічного регламенту безпеки машин**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62.

✓ Наказом Мінекономіки від 21 лютого 2025 року № 1356 затверджено зміни до Переліку національних стандартів для цілей застосування **Технічного регламенту безпеки машин**, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62.

✓ Наказом Мінекономіки від 19 березня 2025 року № 1807 затверджено зміни до Переліку національних стандартів для цілей застосування **Технічного регламенту безпеки машин**,

	затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62. ✓ Наказом Мінекономіки від 25 березня 2025 року № 1880 затверджено зміни до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62. ✓ Наказом Мінекономіки від 06 лютого 2025 року № 941 затверджено зміни до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067. ✓ Наказом Мінекономіки від 18 березня 2025 року № 1796 затверджено зміни до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067.
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:	✓ Прийняття як національних європейських стандартів, положення яких передбачають виконання індикатора заходу (зобов'язання).
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ	❖ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

4. ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ТА БІЛЬШ СТІЙКОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (Розділ 10. Енергетичний сектор)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання», який спрямовано на:

- встановлення чітких правил підключення/відключення до мереж, зон пріоритетного розвитку систем централізованого теплопостачання;
- удосконалення процедур встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках для забезпечення належного дистанційного контролю та управління попитом.

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Пунктом 130 Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

✓ Станом на 01 липня 2025 року законопроект не зареєстровано у Верховній Раді України.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

✓ Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання», положення якого передбачають виконання індикатора заходу (зобов'язання).

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

⚠ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

5. ЗАТВЕРДЖЕННЯ 2-ГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВНЕСКУ УКРАЇНИ ДО ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ

(Розділ 27. Навколишнє середовище та зміна клімату)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Набирає чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 2-го національно визначеного внеску України до Паризької угоди» (далі – НВВ). НВВ зосереджується на таких основних напрямках:

- вищий показник скорочення викидів, ніж у поточному НВВ України;
- встановлення базового року для обрахунку викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів;
- тривалість впровадження та/або періоди часу реалізації запропонованих заходів;
- сфера й охоплення секторів економіки та парникових газів;
- планування процесів, припущення й методологічні підходи, що були використані, зокрема для оцінки та обліку антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів;
- обґрунтування справедливості й амбітності НВВ у світлі національних обставин;

- внесок у досягнення мети Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та щодо обмеження викидів парникових газів / підвищення якості поглиначів, згідно з метою, викладеною у статті 2 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди буде більш амбітним порівняно з поточним Оновленим національно визначеним внеском України до Паризької угоди.

Відповідальні виконавці: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Пунктом 369 Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди.

✓ 11 червня 2025 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України **оприлюднило для обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди»¹¹**, який розроблено з метою схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди, який містить ціль України щодо скорочення викидів парникових газів до 2035 року; планується його подання до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату для забезпечення виконання міжнародних зобов'язань за Паризькою угодою.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

✓ Набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди», положення якого передбачають виконання індикатора заходу (зобов'язання).

¹¹ Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди». URL: <https://mepr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-drugogo-natsionalno-vyznachеного-vnesku-ukrayiny-do-paryzkoyi-ugody/>

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

❓ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

6. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНАМИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТУПУ, ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

(Розділ 1. Реформа державного управління)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Набрання чинності законодавством (включно з підзаконними нормативно-правовими актами), яким передбачено удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби. Зазначене законодавство має відповідати принципам державного управління ОЕСР (SIGMA), що стосуються процедур добору на основі професійних компетентностей.

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної служби.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Пунктом 191 Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів, удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби.

✓ Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) розроблено **проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби»**. Із 12 по 26 лютого 2025 року щодо нього проводилися електронні консультації з громадськістю – проект опублікований на вебсайті НАДС.

До проекту Закону включені зміни щодо конкурсних процедур, кар'єрного просування

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:**РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/
НЕВЧАСНОГО
ВИКОНАННЯ**

державних службовців і припинення державної служби, а також норми про поступове проведення конкурсів на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій, на які призначено осіб без проведення конкурсів відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

✓ Станом на 01 липня 2025 року законопроект не зареєстровано у Верховній Раді України.

✓ Набрання чинності законодавством (зокрема підзаконними нормативно-правовими актами) щодо удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби, положення якого передбачають виконання індикатора заходу (зобов'язання).

❓ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

7. ЗАПОВНЕНО НЕ МЕНШЕ 20 % ВАКАНСІЙ СУДДІВ **(Розділ 3. Судова система)**

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Не менше 20 % вакансій суддів, наявних станом на 16 жовтня 2023 року (загальна кількість вакантних посад 2205), заповнюється на основі зміненого законодавства, яке включатиме такі елементи:

- спрощені етапи добору та скорочені періоди обов'язкової підготовки суддів;

- послідовне застосування чітких та належним чином опублікованих критеріїв оцінювання та методології оцінювання професійної компетентності та доброчесності кандидатів на посаду судді;

- залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів у випадках, коли цього вимагає закон.

Відповідальні виконавці: Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою).

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ Верховна Рада України 9 грудня 2023 року прийняла Закон України № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри», який набрав чинності 30 грудня 2023 року. Вказаним Законом передбачено, серед іншого, скорочення етапів процедур добору на посаду судді та конкурсних процедур і залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів.
- ✓ Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 грудня 2024 року затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).
- ✓ Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів.
- ✓ Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 грудня 2024 року затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).
- ✓ Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року затверджено нове Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ У грудні 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила про початок процедури добору суддів до місцевих судів. Прогнозована кількість вакантних посад – 1800.
- ✓ Офіс Президента України розробив проєкт Стратегії комплексного плану розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства, а також Комплексного стратегічного плану до неї на наступні 5 років, положення яких присвячені таким ключовим напрямом:
 - належне кадрове забезпечення системи судоустрою та подолання кадрового дефіциту в судовій системі;

	- незалежність, ефективність та безперервність суддівського врядування.
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:	✓ Не менше 20 % вакансій суддів, наявних станом на 16 жовтня 2023 року, заповнено.
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ	❖ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як високий.

8. СТВОРЕННЯ НОВОГО СУДУ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ (Розділ 3. Судова система)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Створено новий суд для розгляду адміністративних справ за участю державних органів, який складається з першої та апеляційної інстанцій і судді, якого обирають після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних експертів.

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою).

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:	✓ Верховна Рада України 26 лютого 2025 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду», який передбачає: - реорганізацію адміністративних судів для підвищення якості розгляду адміністративних справ та забезпечення більш справедливого судового процесу; - забезпечення ефективності та прозорості функціонування адміністративного судочинства; - усунення конфлікту інтересів та мінімізація можливих корупційних ризиків у діяльності судів; - підвищення рівня доступу громадян до правосуддя, зокрема шляхом оптимізації структури та підвищення ефективності роботи судових органів.
------------------	---

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Розробка Закону України «Про початок роботи Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду».

Проведення прозорої процедури відбору суддів із залученням незалежних експертів і перевіркою доброчесності та професіоналізму кандидатів для розгляду адміністративних справ за участю центральних органів влади.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

✓ Початок роботи Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

**РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/
НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ**

⚠ Враховуючи, що конкурси на посади суддів судів першої інстанції, суддів апеляційного суду, а також суддів Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС тривають, наразі ступінь ризику невиконання/невчасного початку роботи цих адміністративних судів може оцінюватися як високий.

9. ОЦІНКА ТА, В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВИКОНАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

(Розділ 6. Управління державними активами)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Оцінювання та, за необхідності, внесення змін і введення в дію актів законодавства, визначених у дорожній карті, щоб забезпечити чітке визначення та проведення обов'язкового структурного відокремлення рахунків для діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з виконанням спеціальних обов'язків, у всіх пріоритетних державних компаніях зі списку, затвердженого протокольним рішенням Кабінету Міністрів України, та на яких покладені спеціальні обов'язки.

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство енергетики України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Станом на 01 липня 2025 року Дорожня карта щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних обов'язків та діяльності, не пов'язаної з виконанням спеціальних обов'язків (далі – Дорожня карта), відсутня.

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

✓ Введення в дію актів законодавства, які забезпечать чітке визначення та проведення обов'язкового структурного відокремлення рахунків для діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з виконанням спеціальних обов'язків у всіх пріоритетних державних компаніях зі списку, затвердженого протокольним рішенням Кабінету Міністрів України, та на яких покладені спеціальні обов'язки.

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

⚠ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

10. СКАСУВАННЯ ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ З ACQUIS ЄС

(Розділ 6. Управління державними активами)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Набрання чинності оновленим законодавством про державну допомогу, зокрема щодо послуг загального економічного інтересу з повним відновленням контролю державної допомоги з боку Антимонопольного комітету України.

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Пунктом 133 Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про скасування/зупинення дії Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» з метою відновлення проведення моніторингу

	державної допомоги суб'єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції. ✓ 29 травня 2025 року на засіданні Антимонопольного комітету України схвалено для подання на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про відновлення дії окремих норм Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», особливості їх застосування під час дії воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання» після його погодження відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України¹².
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:	❖ Набрало чинності оновлене законодавство про державну допомогу, що передбачає: - скасування/призупинення дії Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»; - відновлення контролю державної допомоги з боку Антимонопольного комітету.
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ	❖ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

11. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

(Розділ 2. Управління державними фінансами)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Розробка та впровадження цифрового інструменту управління відновленням України, який забезпечує публічний доступ до даних про проекти відновлення на всіх етапах, включаючи планування, фінансування, закупівлі, будівництво та введення в експлуатацію, для забезпечення публічного та прозорого моніторингу реалізації проєктів та кращої координації зусиль із відновлення між секторами.

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України.

¹² АМКУ схвалив законопроект щодо відновлення окремих положень Закону про державну допомогу. URL: <https://amcu.gov.ua/news/amku-skhaluv-zakonoproiekt-shchodo-vidnovlennia-okremikh-polozhen-zakonu-pro-derzhavnu-dopomohu>

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИКОНАНО:

- ✓ 16 січня 2025 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень» (набрав чинності 05.03.2025), згідно з яким Єдиний портфель публічних інвестицій держави формуватиметься з використанням **Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами, в основі якої є екосистема DREAM.**

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

- ✓ Відповідно до Плану заходів із реалізації **Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями** на 2024–2028 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 червня 2024 року № 588-р, розроблено та прийнято акти Кабінету Міністрів України, що визначають:
 - концепцію єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази, опис її основних компонентів, включаючи Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) (єдиний банк проєктів, що пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, забезпечення їх моніторингу); ІТ-системи Мінфіну для планування та моніторингу виконання державного та місцевих бюджетів (відображення відібраних для фінансування проєктів у бюджеті); Prozorro (планування та реалізація закупівель); Казну – виконання проєктів із фінансування та їх взаємна інтеграція для забезпечення наскрізного управління процесом;
 - врегулювання обміну інформацією між Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною системою управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM), ІТ-системами Мінфіну та Мінекономіки для

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

забезпечення наскрізного управління публічними інвестиційними проєктами.

❓ Впровадження цифрового інструменту управління відновленням України, який забезпечує:

- публічний доступ до даних про проєкти відновлення на всіх етапах, включаючи: планування, фінансування, закупівлі, будівництво та введення в експлуатацію;
- забезпечення публічного та прозорого моніторингу реалізації проєктів та кращої координації зусиль із відновлення між секторами.

**РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/
НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ**

❓ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

12. ОПУБЛІКУВАННЯ ЗВІТУ ЗА ПІДСУМКАМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН В УКРАЇНІ (Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами)

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ

Опубліковано звіт про верифікацію запасів критичних корисних копалин в Україні з урахуванням міжнародних систем класифікації, результати відкриті для інвесторів.

Відповідальні виконавці: Державна служба геології та надр України.

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ**ВИКОНАНО:**

✓ 18 грудня 2024 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та регулювання деяких питань стосовно корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення», положення якого, зокрема, визначають, що належить до корисних копалин і компонентів стратегічного та критичного значення.

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:

✓ Державною службою геології та надр України опубліковано для громадського обговорення:

- 30.01.2025 – проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр», що передбачає приведення норм Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до положень Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів корисних копалин 2019 року (РКООН 2019), що позитивно вплине на можливість застосування міжнародних стандартів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин і звітності;
- 04.03.2025 – проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення».

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:

- ✓ Проведено верифікацію запасів критичних корисних копалин в Україні з урахуванням міжнародних систем класифікації, а також:
 - опубліковано звіт;
 - результати верифікації відкриті для інвесторів.

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ

- ⚠ Зважаючи, що строк виконання цього заходу (зобов'язання) – до кінця III кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання може оцінюватися як невисокий.

*Дослідницька служба
Верховної Ради України*

** Цей документ підготовлений Дослідницькою службою Верховної Ради України як довідковий інформаційно-аналітичний матеріал. Інформація та позиції, викладені в документі, не є офіційною позицією Верховної Ради України, її органів або посадових осіб. Цей документ може бути цитований, відтворений та перекладений для некомерційних цілей за умови відповідного посилання на джерело.*
